



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JOAQUIN ARRIETA

MUNICIPIO DE FRESNILLO DEL ESTADO DE ZACATECAS, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023, REUNIDOS EN COL FRANCISCO VILLA LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JOAQUIN ARRIETA

ASI MISMO, EN PRESENCIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL QUIEN HACE CONSTAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

FECHA: 25 DE AGOSTO DEL 2023

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JOAQUIN ARRIETA

SUBREGION: 010
PROGRAMA: ELECTRIFICACION
NOMBRE DEL PROYECTO: ELE ELECTRIFICACION
LOCALIDAD: COL FRANCISCO VILLA
MUNICIPIO: FRESNILLO
MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA
No. DE CONTRATO: MF DS AD FIII 25-23
FECHA DE INICIO: 06 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE TERMINACION: 09 DE AGOSTO DEL 2023



**EL PROYECTO FUE EJECUTADO VIA:
CONSTRUCTORA: ING. JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO.
REPRESENTANTE: ING. JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO.**

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN, EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO, MEDIANTE LA DESCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DESCRIPCION DE LA OBRA: **AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JOAQUIN ARRIETA.**



Javier Ibarra



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JOAQUIN ARRIETA

BENEFICIARIOS: 100 BENEFICIARIOS

INVERSION AUTORIZADA:

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO EN BASE A EL OFICIO DE APROBACION, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION REGISTRA:

No. DE OFICIO	FECHA	TOTAL (\$)	FEDERAL(\$)	ESTATAL(\$)	MUNICIPAL(\$)	PARTICIPANTES (\$)
		\$382,502.40	\$0.00	\$0.00	\$382,502.40	\$0.00

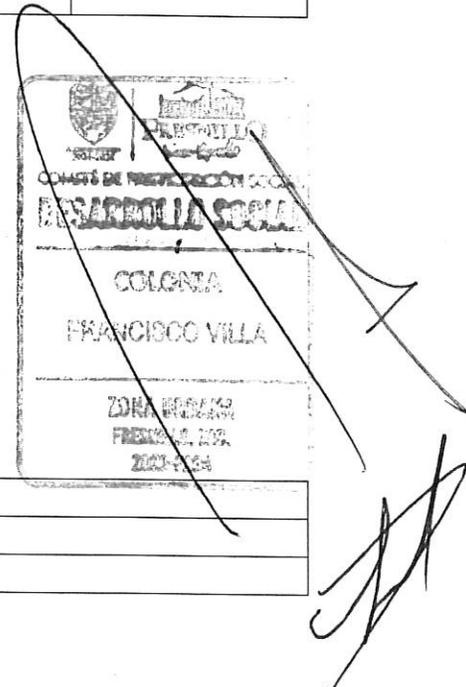
INVERSION EJERCIDA:

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL(\$)	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
2023	\$ 381,894.27	\$0.00	\$0.00	\$381,894.27	\$0.00
TOTAL	\$381,894.27	\$0.00	\$0.00	\$ 381,894.27	\$0.00

MODIFICACIONES: (PRESUPUESTAL DE METAS)

TIPO:

MONTO: \$



RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	\$ 381,894.27
ESTIMACION	\$
TOTAL	\$ 381,894.27

ECONOMIA \$

Armando Caldera Cacat



Javier Bojig T

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JOAQUIN ARRIETA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO O BIEN EN POSIBILIDADES DE ENTRAR EN OPERACIÓN INMEDIATA, CON LA FINALIDAD Y PARA LA QUE FUE EJECUTADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA TAL EFECTO EL CONTRATISTA PRESENTO POLIZAS DE FIANZA DE ANTICIPO No. POR LA CANTIDAD DE \$ Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 2816612 POR LA CANTIDAD DE \$ 38,189.42 Y VICIOS OCULTOS 2821499 POR LA CANTIDAD DE \$ 38,189.42 VIGENTE DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCION, COMO LO INDICA EL TEXTO DE LA FIANZA:

"Y ESTARA EN VIGOR HASTA UN AÑO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR LA DEPENDENCIA."

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, EL COMITÉ DE OBRA O EL ORGANISMO DE FISCALIZACION, DEL MUNICIPIO O DEL ESTADO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO SUS RAZONES.

FUNDAMENTO LEGAL ARTICULOS 145, 146, 149, 150, Y 153 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES.

Armando Caldera Garcia



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JOAQUIN ARRIETA


ENTREGA-RECEPCION:

EL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EL COMITÉ DE OBRA, RECIBEN DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:


LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN PÉREZ GUARDADO
DIR. DE DESARROLLO SOCIAL


LAE. EDUARDO CHAIREZ JAIME
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
COPLAMUN



DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL
VOCAL DE
CONTROL
Y VIGILANCIA

CONTRATISTA DE OBRA


ING. JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO

INSTANCIA REVISORA

ING. ARTURO TORRES LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
DESARROLLO SOCIAL
COLONIA
FRANCISCO VILLA
ZONA URBANA
FRESNILLO, D.F.C.
2021-2024

RECIBE


POR LA AUTORIDAD LOCAL
PUESTO, NOMBRE Y FIRMA


POR EL COMITÉ DE OBRA
PUESTO, NOMBRE Y FIRMA
