

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.
PERIODO QUE SE ENTREGA: JUNIO DE 2019

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PUBLICA
EXPEDIENTES UNITARIOS	ADQUISICIONES
FONDOS FEDERALES	INFRAESTRUCTURA BASICA
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	APORTACIONES
PROGRAMA ANUAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
AGUA POTABLE	ACTAS DE CABILDO
DRENAJES Y LETRINAS	PROPUESTA DE INVERSION
ALCANTARILLADO	OFICIOS DE APROBACION
URBANIZACION MUNICIPAL	HOJAS DE LIBERACION DE RECURSOS
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	RECIBOS DE INGRESOS
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	3X1 PARA MIGRANTES
CAMINOS RURALES	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	PDZP
DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTINGENCIAS ECONOMICAS
GASTOS INDIRECTOS	FORTALECE
APORTACIONES	FOPADEM
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ACTAS DE CONSEJO MUNICIPAL	FONDO MINERO
PROPUESTA DE INVERSION	REMANENTES FISE 2018
OFICIOS DE APROBACION	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
HOJAS DE LIBERACION DE RECURSOS	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO
RECIBOS DE INGRESOS	OTROS
ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS	

OBSERVACIONES

ENTREGAN POR EL ENTE

<p>PRESIDENTE(A) MUNICIPAL</p> <p>LIC. SAÚL MONREAL AVILA</p>	<p>DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL</p> <p>C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES</p>
---	--

POR LA ASE

DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

<p>AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA</p> <p>L.C. Y T.C. HILDA CLAUDIA GARCÍA ALVARADO</p>	<p>JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS</p> <p>L.C. HELENA PUGA CANDELAS</p>
--	---



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.
PERIODO QUE SE ENTREGA: JUNIO DE 2019

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	
ACTA DE CABILDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS	SEGURIDAD PUBLICA
EXPEDIENTES UNITARIOS	ADQUISICIONES
FONDOS FEDERALES	INFRAESTRUCTURA BASICA
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	APORTACIONES
PROGRAMA ANUAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
AGUA POTABLE	ACTAS DE CABILDO
DRENAJES Y LETRINAS	PROPUESTA DE INVERSION
ALCANTARILLADO	OFICIOS DE APROBACION
URBANIZACION MUNICIPAL	HOJAS DE LIBERACION DE RECUSOS
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	RECIBOS DE INGRESOS
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	3X1 PARA MIGRANTES
CAMINOS RURALES	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	PDZP
DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTINGENCIAS ECONOMICAS
GASTOS INDIRECTOS	FORTALECE
APORTACIONES	FOPADEM
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ACTAS DE CONSEJO MUNICIPAL	FONDO MINERO
PROPUESTA DE INVERSION	REMANENTES FISE 2018
OFICIOS DE APROBACION	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
HOJAS DE LIBERACION DE RECURSOS	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO
RECIBOS DE INGRESOS	OTROS
ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS	

OBSERVACIONES

ENTREGAN POR EL ENTE

 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL LIC. SAUL MONREAL AVILA	 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
---	---

POR LA ASE

DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR(A) DE OBRA PÚBLICA L.C. Y.T.C. HILDA CLAUDIA GARCÍA ALVARADO	JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS L.C. HELENA PUGA CANDELAS
---	--



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE - FÍSICO FINANCIERO

MES DE JUNIO 2019

FISE REMANENTES 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO MENSUAL FISE REMANENTES 2018
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

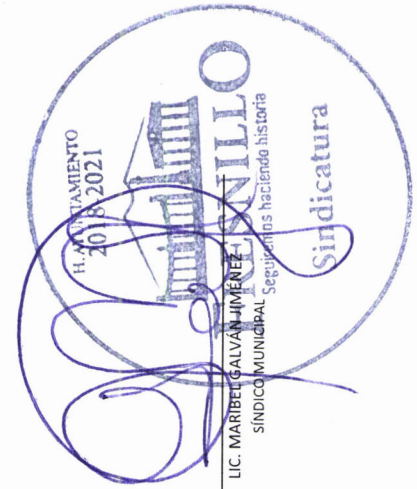
FECHA: 25/07/2019
 HOJA: 1 DE 1

PROGRAMA DE GOBIERNO: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
 SUB-PROGRAMA: 628 FISE REMANENTES 2018
 MES QUE INFORMA: JUNIO DEL 2019

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN						
	NÚMERO (Clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS					PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO										
18FISE10001	B01003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS	COMUNIDAD LOS ÁNGELES DE LOS MEDRANO	23° 14' 08.7" N 102° 55' 32.7" O	1.330 ML	\$ 1,350,630.61	\$ -	\$ 1,349,732.22	\$ 1,349,732.22	\$ 1,349,732.22	N/A	\$ -	100%	N/A	X					
18FISE10002	B01004	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS.	COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE	23° 23' 53.0" N 103° 29' 19.0" O	811 ML	\$ 1,349,618.16	\$ 254,740.76	\$ 975,182.63	\$ 348,787.64	\$ 720,441.87	N/A	\$ -	53%	N/A	X					
18FISE10003	B01005	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES TUCANES, COLIBRIES, CISNES, PAVORREAL, BUHO, HALCON Y RIO NAZAS EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS	COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS	23° 09' 53.4" N 102° 53' 55.8" O	2,129 ML	\$ 1,759,326.48	\$ -	\$ 1,759,326.48	\$ -	\$ 1,759,326.48	N/A	\$ -	100%	N/A	X					
TOTAL							\$ 4,459,575.25	\$ 254,740.76	\$ 4,084,241.33	\$ 1,698,519.86	\$ 3,829,500.57	\$ -	\$ -							



LIC. SAUL PAVORREAL ÁVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ
 SINDICO MUNICIPAL



CINIA IRENE MAGALANES VILLARES
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL



UNICPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019
F. Financiamiento: 628 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2019 11:35 a. m.

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
628	FISE REMANENTES 2018												
B01003	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZAC.												
430	DESARROLLO SOCIAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,350,630.61	\$1,350,630.61	\$0.00	\$898.39	\$0.00	\$0.00	\$1,350,630.61	\$0.00	\$1,349,732.22	-\$1,349,732.22
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,350,630.61	\$1,350,630.61	\$0.00	\$898.39	\$0.00	\$0.00	\$1,350,630.61	\$0.00	\$1,349,732.22	-\$1,349,732.22
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$1,350,630.61	\$1,350,630.61	\$0.00	\$898.39	\$0.00	\$0.00	\$1,350,630.61	\$0.00	\$1,349,732.22	-\$1,349,732.22
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$1,350,630.61	\$1,350,630.61	\$0.00	\$898.39	\$0.00	\$0.00	\$1,350,630.61	\$0.00	\$1,349,732.22	-\$1,349,732.22
628	B01003 430		\$0.00	\$1,350,630.61	\$1,350,630.61	\$0.00	\$898.39	\$0.00	\$0.00	\$1,350,630.61	\$0.00	\$1,349,732.22	-\$1,349,732.22
	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,350,630.61	\$1,350,630.61	\$0.00	\$898.39	\$0.00	\$0.00	\$1,350,630.61	\$0.00	\$1,349,732.22	-\$1,349,732.22
	CONSTRUCCION DE RED DE DRI		\$0.00	\$1,350,630.61	\$1,350,630.61	\$0.00	\$898.39	\$0.00	\$0.00	\$1,350,630.61	\$0.00	\$1,349,732.22	-\$1,349,732.22
B01004	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZAC.												
430	DESARROLLO SOCIAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,349,618.16	\$1,349,618.16	\$0.00	\$0.00	\$254,740.76	-\$254,740.76	\$1,094,877.40	\$254,740.76	\$348,787.64	-\$94,046.88
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,349,618.16	\$1,349,618.16	\$0.00	\$0.00	\$254,740.76	-\$254,740.76	\$1,094,877.40	\$254,740.76	\$348,787.64	-\$94,046.88
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$1,349,618.16	\$1,349,618.16	\$0.00	\$0.00	\$254,740.76	-\$254,740.76	\$1,094,877.40	\$254,740.76	\$348,787.64	-\$94,046.88
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$1,349,618.16	\$1,349,618.16	\$0.00	\$0.00	\$254,740.76	-\$254,740.76	\$1,094,877.40	\$254,740.76	\$348,787.64	-\$94,046.88
628	B01004 430		\$0.00	\$1,349,618.16	\$1,349,618.16	\$0.00	\$0.00	\$254,740.76	-\$254,740.76	\$1,094,877.40	\$254,740.76	\$348,787.64	-\$94,046.88
	DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,349,618.16	\$1,349,618.16	\$0.00	\$0.00	\$254,740.76	-\$254,740.76	\$1,094,877.40	\$254,740.76	\$348,787.64	-\$94,046.88



INICIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2019

F. Financiamiento: 628 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2019 11:35 a. m.

Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	\$0.00	\$1,349,618.16	\$1,349,618.16	\$0.00	\$0.00	\$254,740.76	-\$254,740.76	\$1,094,877.40	\$254,740.76	\$348,787.64	-\$94,046.88
B01005			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TUCANES, COLIBRIES, CISNES, PAVORREALES, BUHO, HALCON Y RIO NAZAS EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$1,759,326.48	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
430			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,759,326.48	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,759,326.48	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,759,326.48	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,759,326.48	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,759,326.48	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
628	B01005	430	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,759,326.48	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DRENA	\$0.00	\$1,759,326.48	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,326.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FISE REMANENTES 2018	\$0.00	\$4,459,575.25	\$4,459,575.25	\$0.00	\$898.39	\$254,740.76	-\$254,740.76	\$4,204,834.49	\$254,740.76	\$1,698,519.86	-\$1,443,779.10
			Total Final	\$0.00	\$4,459,575.25	\$4,459,575.25	\$0.00	\$898.39	\$254,740.76	-\$254,740.76	\$4,204,834.49	\$254,740.76	\$1,698,519.86	-\$1,443,779.10

